



## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONIE**

- WYKONAWCA: BUDOPOL-Poznań Sp. z o.o.,
- DATA ZAWARCIA UMOWY: 24 czerwca 2024 r.
- WARTOŚĆ: **18.065.800,00 zł**
- TERMIN WYKONANIA : **30 września 2025 r. (465 dni)**
- DOFINANSOWANIE:

z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  
w wysokości: **14.000.000,00 zł.**

## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

---

## ZAKRES INWESTYCJI:

- rozbiórka istniejącego budynku i boiska,
- budowa nowego budynku dydaktycznego z łącznikiem:
  - 5 sal dydaktycznych wraz z zapleczeniami,
  - świetlica/jadalnia z kuchnią cateringową,
  - zaplecze sanitarne,
- sala gimnastyczna z boiskiem do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, zapleczem szatniowo-magazynowym i pełnym węzłem sanitarnym,
- zewnętrzne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
- bieżnia z trzema torami wraz z zeskokiem do skoku w dal,
- parking - 36 mp., chodniki, oświetlenie, mała architektura, plac zabaw, nasadzenia zieleni.

## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

---

Budynek szkoły spełniać będzie wymagane parametry użytkowe przy zachowaniu optymalnych kosztów eksploatacyjnych dzięki:

- instalacji grzewczej opartej o zestaw 3 pomp ciepła typu powietrze-woda do temp zewn. -5 °C, a poniżej jej wspomaganej kotłem gazowym,
- ogrzewanie podłogowe z wyłączeniem powierzchni magazynowych,
- instalację chłodniczą opartą na systemie powietrznym - centrale wentylacyjne z agregatami grzewczo-chłodzącymi (pompy ciepła)
- sale lekcyjne wyposażone w klimatyzatory,
- wentylację mechaniczną z agregatami grzewczo-chłodzącymi,
- instalację fotowoltaiczną - składającą się z 110 paneli fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 49,5 kWp.

## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

---

STAN ZAAWANSOWANIA – 66,28 %

TRWAJĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z:

- montażem instalacji, układaniem płytek, elewacji klinkierowej, roboty brukarskie

WYPOSAŻENIE:

Aktualnie trwa procedura zakupowa związana z:

- wyposażeniem meblowym - ławki, krzesła, biurka, fotele, szafy, siedziska, tablice, szafki szatniowe,
- sprzętem komputerowym - komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, wyposażeniem AGD,
- wyposażeniem sportowym.

SIEĆ WODOCIĄGOWA – zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej Wierzonka-Karłowice. Wartość umowy: 3.204.710,22 zł. Termin: 11.10.25 r.

**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WIERZONCE**

---



## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**




## ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE



## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**




## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

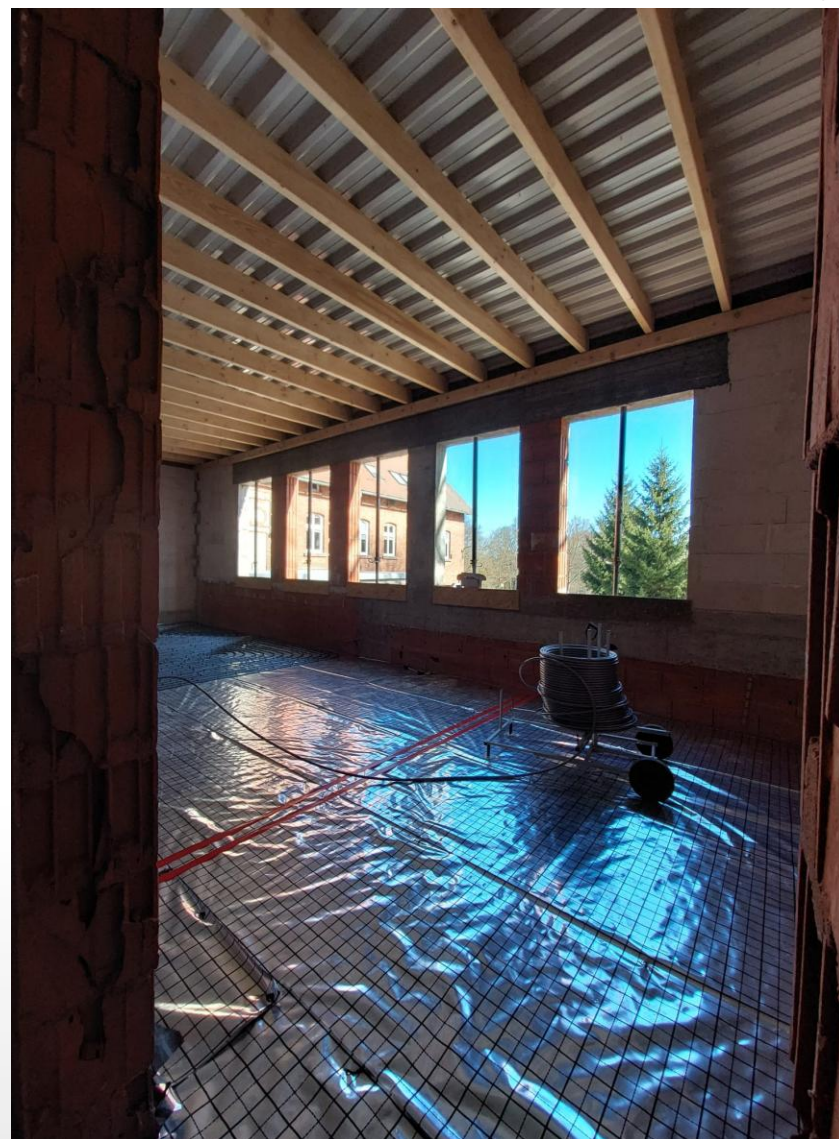

## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**



## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

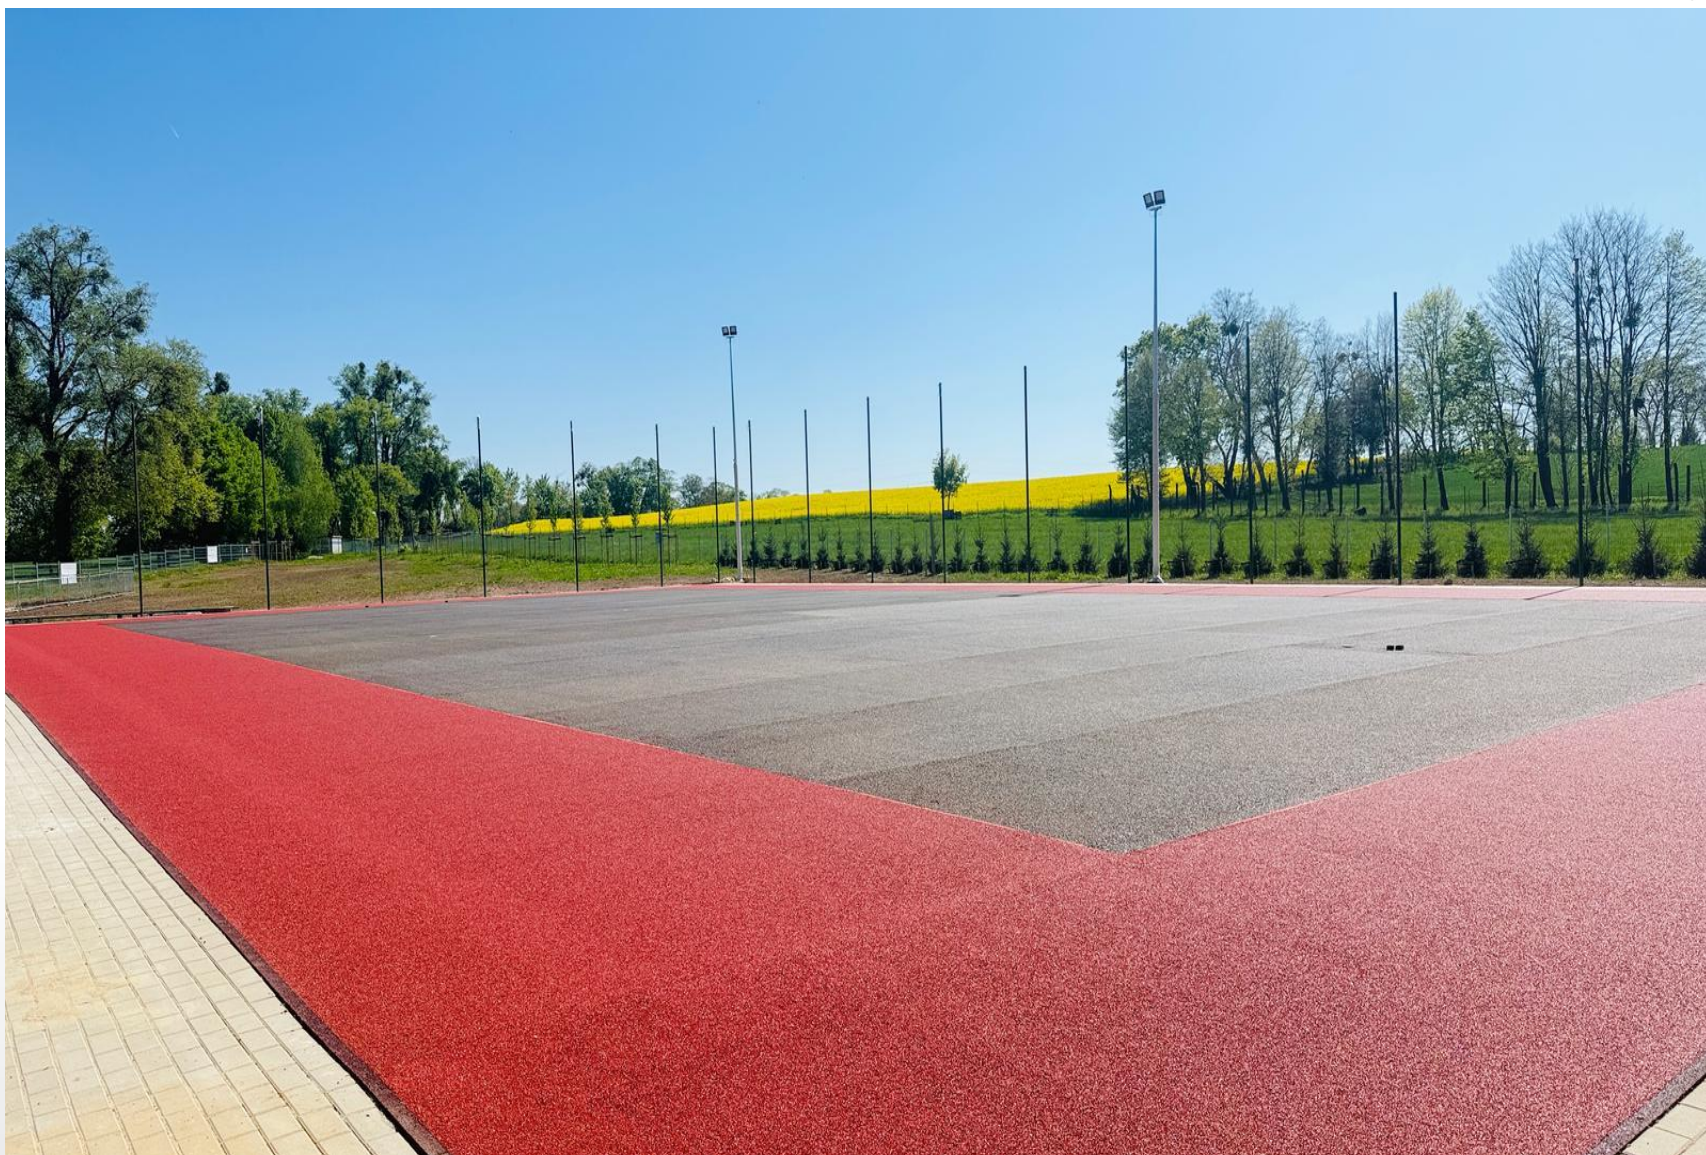

## **ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZONCE**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WIERZONCIE**
